



ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
24 Mawrth 2023

TEITL: Ynni Lleol Blaengar - Achos Busnes Amlinellol

AWDUR: Elgan Roberts, Rheolwr Prosiect Ynni

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) ar gyfer Ynni Lleol Blaengar i'w ystyried gan y Bwrdd.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

- 2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Ynni Lleol Blaengar ac, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraethau Cymru a'r DU o'r broses sicrwydd yr ymgwymerwyd â hi a bod y Swyddfa Rheoli Portffolio yn rhoi sylw i'r materion sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad, bod cais Adran 7 yn cael ei wneud i baratoi Achos Busnes Llawn i'r Bwrdd ei ystyried yn dilyn cwblhau'r broses gaffael a'r broses ganiatâd.
- 2.2. Bod y Bwrdd yn dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, gymeradwyaeth derfynol o'r fanyleb gaffael a'r meini prawf gwerth cymdeithasol cyn i ariannwr y prosiect ddechrau caffael.
- 2.3. Bod y Bwrdd yn nodi y bydd y trefniadau ariannol terfynol ar gyfer y prosiect yn cael eu cytuno ar y cam Achos Busnes Llawn ac yn awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro'r Awdurdod Lletya i gytuno ar y telerau drafft i'w cymeradwyo gan y Bwrdd.


3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd i Achos Busnes Amlinellol (OBC) y prosiect Ynni Lleol Blaengar.

4. CEFNDIR A PHROSES

- 4.1. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gyflawni buddsoddiad trawsffurfiol o £1 biliwn yn economi'r Gogledd. Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yn y Gogledd, gan adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd wrth fynd i'r afael â heriau a rhwystrau economaidd hir-dymor i gyflawni twf cynhwysol.
- 4.2. Yn unol â chytundeb terfynol y Cynllun Twf, caiff achosion busnes eu datblygu ar gyfer pob prosiect o fewn y Cynllun Twf, yn unol â'r canllawiau 'Better Business Case' a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru a Thrysorlys EM. Bydd pob achos busnes yn cynnwys pum achos a fydd yn rhoi sylw i gwestiynau allweddol a dylid eu cefnogi gan weithdai. Mae'r diagram isod yn rhoi

trosolwg o'r pum achos, y cwestiynau allweddol a'r hyn y mae'n rhaid i'r achos busnes ei arddangos.

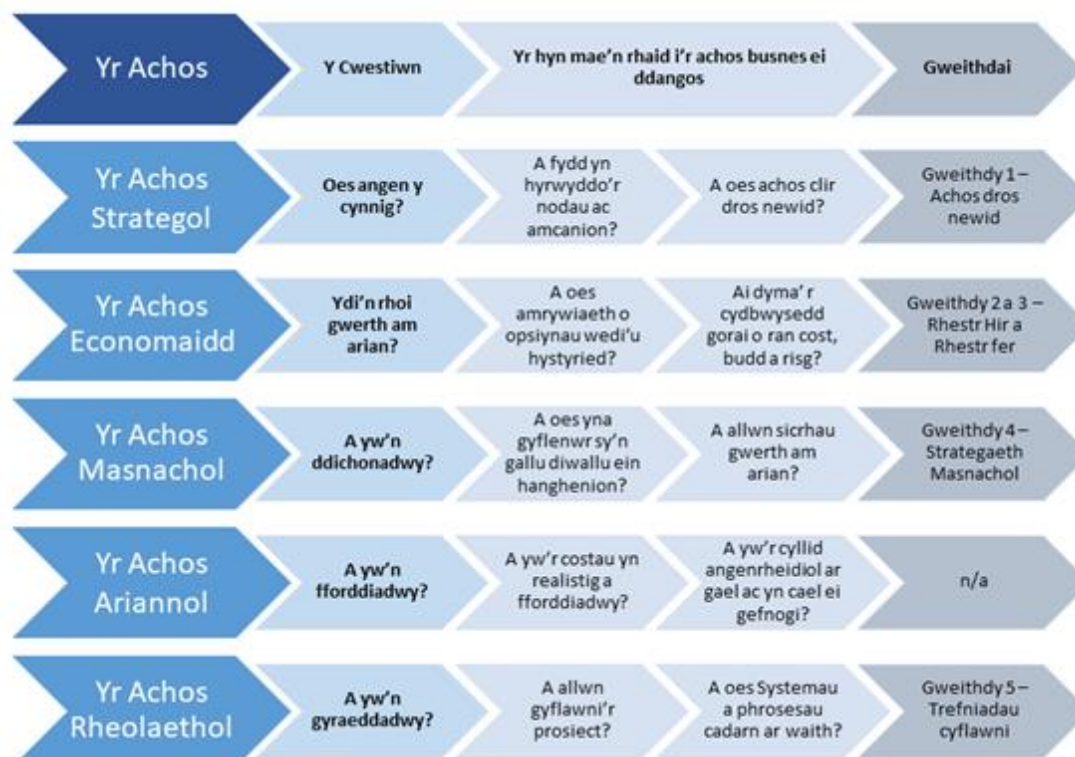

- 4.3. Mae'r Bwrdd Uchelgais yn gweithredu fel y corff gwneud penderfyniadau ar gyfer y Cynllun Twf gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, fel arianwyr y Cynllun Twf, yn cadw rôl wrth gymeradwyo'r broses sicrwydd y mae pob prosiect wedi ymgymryd â hi. Bydd y broses sicrwydd y bydd y prosiectau'n ymgymryd â hi wedi'i chynnwys yn yr holl adroddiadau i'w hystyried.
- 4.4. Datblygwyd yr Achos Busnes Amlinellol Ynni Lleol Blaengar gan y Swyddfa Rheoli Portffolio yn unol â'r canllawiau 'Better Business Case'. Mae'r OBC yn ymdrin â'r cam cynllunio prosiect. Pwrpas y cam hwn yw adnabod yr opsiwn sy'n gwneud y mwyaf o werth cyhoeddus yn dilyn gwerthusiad manwl; ac amlinellu'r Cynllun posib gan hefyd gadarnhau fforddiadwyedd a rhoi'r trefniadau rheoli yn eu lle er mwyn cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.
- 4.5. Byddai'r Bwrdd Uchelgais yn cymeradwyo'r OBC yn darparu'r gymeradwyaeth angenrheidiol er mwyn i'r prosiect symud ymlaen i'r wedd nesaf, a fyddai, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o'r broses sicrwydd, yn gweld y broses gaffael yn cael ei chwblhau ar ôl cynnal Adolygiad Cyhoeddus a'r Achos Busnes Llawn (FBC) yn cael ei ddatblygu ar gyfer penderfyniad buddsoddiad terfynol gan y Bwrdd Uchelgais.
- 4.6. Pe byddai'r Bwrdd yn penderfynu peidio â chymeradwyo'r OBC, gall wrthod yr achos busnes yn llwyr neu ofyn am ragor o wybodaeth i'w chynnwys mewn fersiwn diwygiedig o'r achos busnes i'w hystyried.

5. CYFLWYNIAD I'R PROSIECT YNNI LLEOL BLAENGAR

- 5.1. Mae'r prosiect Ynni Lleol Blaengar yn ffurfio rhan o'r rhaglen Ynni Carbon Isel sy'n anelu at ddatgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.
- 5.2. Nod y prosiect Ynni Lleol Blaengar yw sefydlu cronfa £25m i'w buddsoddi ar draws pob maes ymyrraeth sy'n alinio â'r Strategaeth Ynni Rhanbarthol. Bydd y gronfa'n cael ei gweinyddu gan Uchelgais Gogledd Cymru dros gyfnod o hyd at 10 mlynedd. Bydd cyllid cyfalaf yn cael ei ddyrannu drwy grantiau, benthyciadau neu offerynnau ariannol eraill, gyda tharged o 75% arian cyfatebol fel cyfartaledd ar draws y gronfa.
- 5.3. Mae amcanion gwario y prosiect fel a ganlyn:

Amcan Gwariant Cyntaf y Prosiect - Creu Swyddi	Creu 156-193 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru sy'n gysylltiedig â chyflawni a gweithredu datrysiadau ynni glân sy'n cyfrannu at GVA ychwanegol net o £110-134M erbyn 2036.
Ail Amcan Gwariant y Prosiect - Buddsoddiad	Cyflawni cyfanswm buddsoddiad o £101-111M mewn datrysiadau ynni glân yng Ngogledd Cymru erbyn 2036.
Trydydd Amcan Gwariant y Prosiect - Arbedion Carbon	Creu 130,000-170,000 tonnelli o arbedion carbon o well effeithiolrwydd a datgarboneiddio systemau ynni yng Ngogledd Cymru gan ddefnyddio amrediad eang o ddatrysiadau erbyn 2036.
Pedwerydd Amcan Gwariant y Prosiect - Perchnogaeth Leol	Sefydlu elfen o berchnogaeth leol gryf a chynaliadwy tuag at yr asedau ynni glân newydd a gyflwynir ac a gefnogir drwy sicrhau bod amcan polisi perchnogaeth leol a chydberchnogaeth Llywodraeth Cymru yn cael ei bodloni neu y rhagorir arni gan bob buddsoddiad prosiect ¹ .

- 5.4. Amcangyfrifir bod effaith y prosiect ar lefel Cymru yn **£133m GVA ychwanegol (heb ei ddisgowntio) a NSPV gyda disgownt o oddeutu £100m** a Chymhareb Cost Budd (BCR) o 3.88 (Cyfanswm cyllid sector cyhoeddus).

Dros dymor y Cynllun Twf 15 mlynedd, rhagamcanir i'r prosiect gyflawni'r buddion mesuradwy eraill fel a ganlyn:

- Creu cyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol – Hyd at 193 o swyddi
- Cynnydd mewn cyflogaeth gwerth uchel, yn arbennig ar gyfer merched, pobl ifanc o'r Gogledd a'r rhai o gymunedau gwledig ac incwm isel
- Incwm o gynhyrchu ynni
- Llai o gostau ynni
- Gostyngiad mewn allyriadau CO²

- 5.5. O fewn yr OBC, mae'n esbonio sut y bydd y prosiect yn cyflawni datganiad sefyllfa Hinsawdd a Bioamrywiaeth y Bwrdd Uchelgais. Bydd angen i ran-ddeiliaid sy'n ymgeisio am gyllid nodi effeithiau allyriadau carbon a bioamrywiaeth eu cynigion a sut maent yn ceisio alinio â

¹Yn unol â 'Local and shared ownership of energy projects in Wales: Guidance for developers, local communities & decision-makers'

thargedau'r Cynllun Twf. Bydd lefel y manylder a'r cyfiawnhad fydd ei angen gan ymgeiswyr yn cyfateb i swm y cyllid y gwneir cais amdano.

- 5.6. O fewn yr OBC, mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn esbonio sut mae'r prosiect yn cyd-fynd ag Egwyddorion Caffael mabwysiedig y Bwrdd Uchelgais Economaidd. I sicrhau aliniad â'r uchod, mae'r prosiect wedi ymgymryd ag ymarferiad mapio i ddangos sut bydd caffael y prosiect yn cyflawni yn erbyn yr egwyddorion hyn.

6. PROSES SICRWYDD A DEILLIANAU

- 6.1. Yn unol â'r trefniadau sydd wedi'u nodi o fewn cytundeb terfynol y Cynllun Twf, mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi bod yn ddarostyngedig i'r gweithgaredd sicrwydd a ganlyn:

Gweithgaredd Sicrwydd	Dyddiad	Deilliannau
Gweithdai Achos Busnes	Awst - Rhag 2022	Yn unol â'r canllawiau, cynhaliwyd gweithdai i gefnogi datblygiad yr OBC gyda mewnbwn gan amrediad eang o ran-ddeiliaid.
Adolygiad OBC cychwynnol y PMO	Ionawr 2023	Gyda chefnogaeth gan ymgynghorwyr allanol a mewnbwn gan economegydd Llywodraeth Cymru, fe wnaeth adolygiad cychwynnol y PMO arwain at gyfres o argymhellion ynghylch sut y gellir cryfhau'r OBC.
Adolygiad Porth 2	13-15 Chwefror 2023	Canfu'r tîm adolygu bod yr OBC o ansawdd uchel ac roedd y broses ar gyfer datblygu'r OBC a llywodraethu'r Prosiect hefyd yn dda iawn. Cydnabuwyd yn eang bod natur y Prosiect yn golygu bod ansicrwydd anochel dros wireddu buddiannau ar y cam hwn. Mae'r hyder cyflawni yn cael ei asesu yn erbyn y tebygolrwydd o gyflawni amcanion y Prosiect o fewn y cyfnod amser 15 mlynedd. Ar y sail hwnnw, mae'r sgôr yn Ambr; mae materion arwyddocaol wedi cael eu hadnabod, ond mae hyder y bydd rhain yn cael eu datrys.
Adolygiad y Bwrdd Prosiect a Rhaglen	31 Ion 2023 hyd 17 Chwef 2023	Arweiniodd yr adolygiad at nifer fechan o argymhellion i gryfhau'r OBC.
Ardystiad y Bwrdd Prosiect	24 Chwe 2023	Ardystio heb amodau
Ardystiad y Bwrdd Rhaglen	1 Maw 2023	Ardystio heb amodau
Ardystiad y Bwrdd Portffolio	3 Maw 2023	Ardystio heb amodau
Ardystiad y Bwrdd Cyflawni Busnes	14 Maw 2023	Ardystio heb amodau
Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd	24 Mawrth	<i>I'w gadarnhau</i>

7. TROSOLWG Y PMO O'R OBC AC ARGYMHELLION ALLWEDDOL

- 7.1. Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o asesiad y PMO, y Bwrdd Prosiect, y Bwrdd Rhaglen ac Aseiad Adolygu Porth 2 yr Achos Busnes Amlinellol (OBC) a'r argymhellion allweddol fydd yn cael sylw gan caffael neu gan Achos Busnes Llawn (FBC).

Adran OBC	Crynodeb o Aseiad y PMO, Aseiad y Bwrdd Prosiect a Rhaglen	Prif Argymhellion
Achos Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Cynnig yn alinio â nodau/amcanion y Cynllun Twf a'r Rhaglen Amcanion gwariant yn glir ac yn GAMPUS (SMART) Mae angen clir a galw am y prosiect. Mae'r buddion wedi cael eu diffinio'n glir Mae'r prif risgiau wedi'u hadnabod Mae'r cyfyngiadau a'r dibyniaethau allweddol wedi'u hadnabod 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parhau i ddiweddarau'r rhestr o ffynonellau ariannu eraill sydd ar gael gan ei bod yn newid yn aml yn y sector hwn. Ystyried sut all unrhyw newidiadau effeithio ar yr achos strategol ar gyfer y prosiect hwn.
Achos Economaidd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ffactorau llwyddiant hanfodol wedi'u hadnabod ac maent yn briodol Mae rhestr fer o opsiynau wedi'i hadnabod ac mae'n glir sut y daethpwyd at hyn Mae'r rhestr fer o'r opsiynau wedi bod yn destun dadansoddiad cadarn Mae tystiolaeth gref i gefnogi'r dadansoddiad o'r opsiwn a ffafrir. Mae'r arfarniad economaidd yn dangos y bydd y prosiect yn cyflawni gwerth da am arian 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd
Achos Masnachol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r strategaeth gaffael arfaethedig wedi'i nodi a'i hegluro'n glir Mae'r strategaeth yn cyflawni yn erbyn egwyddorion caffael y Bwrdd Uchelgais Economaidd Mae sgôp i gyflawni bargaen a fyddai'n bodloni amcanion y prosiect a sicrhau gwerth am arian Mae'r fargen bosib wedi cael ei hystyried mewn digon o fanylder Mae'n debygol y bydd y fargen bosib yn dderbyniol ac y bydd modd i'r sector preifat ei chyflawni; bydd profi'r farchnad 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadarnhau sgôp y gwaith ar gyfer Ymgynghorydd Cronfa yn ystod y wedd weithredol <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd

Adran OBC	Crynodeb o Asesiad y PMO, Asesiad y Bwrdd Prosiect a Rhaglen	Prif Argymhellion
	<p>yn anffurfiol yn ychwanegu sicrwydd i'r broses</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae'r achos masnachol yn ymdrin â gwedd weithredol deilliannau'r prosiect 	
Achos Ariannol	<ul style="list-style-type: none"> Mae dadansoddiad o gostau'r prosiect wedi'i ddarparu Mae'n glir o le y daw'r cyllid cyfalaf ar gyfer y prosiect Mae arfarniad ariannol wedi'i gynnwys ar gyfer yr opsiwn a ffafrir Mae dadansoddiad o gostau gweithredol (refeniw) ac incwm wedi'i gynnwys Mae'n glir lle mae'n debygol y daw'r cyllid gweithredol arfaethedig ar gyfer y prosiect, ond mae peth ansicrwydd yn parhau o ran y ffynhonnell 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadarnhad o ffynhonnell y cyllid refeniw ar gyfer dwy flynedd gyntaf y wedd weithredol
Achos Rheolaeth	<ul style="list-style-type: none"> Mae trefniadau llywodraethu clir (e.e. rheoli prosiect) yn eu lle ar gyfer y wedd cyflawni prosiect Mae trefniadau priodol yn eu lle ar gyfer rheoli a monitro risg Cymerwyd cyngor proffesiynol allanol i gefnogi'r prosiect (e.e. astudiaethau dichonoldeb, cyngor cyfreithiol, ac ati) Mae gweithdrefnau rheoli newid yn eu lle Mae cynlluniau adnoddau clir (e.e. rheoli, staffio) yn eu lle ar gyfer gwedd weithredol y prosiect Mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer gwireddu buddion, monitro ac arfarnu 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ystyried sut all prifysgolion sy'n bartneriaid ac eraill gefnogi gyda diwydrwydd dyledus ac allyriadau a gweithgareddau bioamrywiaeth. <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cynllun ymgysylltu â rhan-ddeiliaid i'w ddatblygu ymhellach gyda pherchnogaeth glir er mwyn ei yrru ymlaen I adolygu perchnogaeth risg wrth symud ymlaen gan bod y rhan fwyaf gyda SRO ar hyn o bryd Ystyried sut ellir rhoi cefnogaeth parodrwydd buddsoddwyr i ymgeiswyr i'w helpu i ddatblygu cyflwyniadau
Methodoleg Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	<ul style="list-style-type: none"> Cynllun i ddod ag arbenigwr i mewn ar ôl yr OBC i ymgorffori'r fethodoleg yn ym mhroses ymgeisio'r gronfa. 	<p>Gan Caffael:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd <p>Erbyn FBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ddim ar hyn o bryd

7.2. Prif Risgiau a Lliniaru

- 7.2.1. Mae Adran 1.9, 2.9 a 4.4 yr OBC yn disgrifio risgiau allweddol y prosiect ac amlinelliad o'r strategaeth lliniaru, fel y crynhoir isod. Disgwylir i'r risgiau gael eu datrys neu eu lleihau cyn i'r FBC gael ei gyflwyno.

Risgiau	Lliniaru
Os oes diffyg ceisiadau addas am gyllid Ynni Lleol Blaengar, mae risg na fydd Amcanion Gwario'r Prosiect yn cael eu cyflawni.	<ul style="list-style-type: none"> - Mae'r ffordd ymlaen a ffafrir yn seiliedig ar gronfa agored yn hytrach na chronfa wedi'i thargedu er mwyn osgoi rhoi disgowntn diangen ar gyfleoedd buddsoddi da. Bydd y gronfa'n hyblyg a bydd cyfle i ymestyn y cyfnod os oes angen. [WEDI CAU] - Cwblhaodd ANW astudiaethau dichonolrwydd SLES ac SOC's ar gyfer y 4 ardal ALL yng Ngogledd Cymru gyda chyllid CRF - bydd hyn yn helpu i adnabod prosiectau posib a chodi ymwybyddiaeth o'r prosiect SLE. [WEDI CAU] - Roedd yr holiadur ymchwil y farchnad yn darparu gwell dealltwriaeth o'r galw am gyllid a'r math o gyllid oedd ei angen. [WEDI CAU] - Datblygir achos busnes prosiect cadarn yn unol â'r model Pum Achos Busnes i asesu'r opsiynau yn llwyr gyda mewnbwn gan ran-ddeiliaid allweddol i sicrhau bod yr holl opsiynau posib yn cael eu hystyried a'u hasesu yn erbyn yr Amcanion Gwario, a'u bod yn cyflawni gwerth am arian ac yn fforddiadwy. [PARHAUS] - Bydd y gan y prosiect gynllun marchnata, ymgysylltu â rhan-ddeiliaid a chyfathrebu cadarn yn ei le i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cyfleoedd a buddion. [PARHAUS] - Bid SPF wedi'i wneud am gyllid i ddarparu cefnogaeth parodrwydd buddsoddwyr i gefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol i ddatblygu eu cynigion. [PARHAUS]
Os nad oes modd trosoli buddsoddiad preifat a chyhoeddus; mae risg na fydd Amcanion Gwario'r Prosiect (swyddi, buddsoddiad, arbed carbon a pherchnogaeth leol) yn cael eu cyflawni.	<ul style="list-style-type: none"> - Dosbarthwyd holiadur ymchwil y farchnad i ran-ddeiliaid i ennyn gwell dealltwriaeth o'r galw am gyllid a'r math o gyllid sydd ei angen a lle y gallai cyllid arall wedi'i drosoli ddod. [WEDI CAU] - Strwythur y gronfa wedi'i dylunio er mwyn cael y cyfleoedd cyd-fuddsoddi mwyaf. [WEDI CAU] - Datblygir achos busnes prosiect cadarn yn unol â'r model Pum Achos Busnes i sicrhau bod yr allbynnau yn cyflawni gwerth am arian ac yn fforddiadwy. [PARHAUS] - Bydd yr achos busnes hefyd yn edrych ar ffrydiau cyllido posib eraill a allai ymgeiswyr gael atynt / eu defnyddio, fel arian cyfatebol i gyllid y Cynllun Twf. Bydd y darpar ymgeiswyr yn cael gwybod am gyfleoedd, a gellir sefydlu partneriaeth bosib â chyllidwyr eraill i helpu i hwyluso trosoledd. [PARHAUS] - Ymgysylltu â chyflawnwyr allweddol y cronfeydd a'r cynnyrch ariannol presennol i archwilio cyfleoedd partneriaeth a allai arwain at drosoli buddsoddiad ychwanegol neu ddatrysiadau cyd-ariannu. [PARHAUS]
Os oes diffyg capasiti adnoddau a gallu sgiliau yn y tîm prosiect, rhanbarth, cadwyn gyflenwi a rhan-ddeiliaid eraill (PMO, Partneriaid, perchnogion allbynnau), mae risg na fydd allbynnau'n cael eu cyflawni o fewn graddfeydd amser y Cynllun Twf.	<ul style="list-style-type: none"> - Mae gan y prosiect reolwr prosiect dynodedig a chefnogaeth dda yn y PMO a chyllid yn ei le ar gyfer y cam datblygu FBC. [WEDI CAU] - Mae partneriaid y Bwrdd Uchelgais yn cael eu cynrychioli ar y bwrdd prosiect, bwrdd rhaglen, bwrdd portffolio a'r Bwrdd Uchelgais a bydd materion yn ymwneud â chapasiti a gallu yn cael eu esgoli i fyny'r byrddau. [WEDI CAU] - Defnyddir Sell2wales, a bydd cronfa ddata gynyddol y PMO o arbenigwyr yn cael ei hysbysu o gyfleoedd tendro i ddarparu cefnogaeth arbenigol i ddatblygiad a chyflwyniad y prosiect. [PARHAUS] - Arbenigwr y gronfa yn cael ei gynnwys i gynorthwyo â datblygu'r Achos Busnes a bydd Ymgynghorydd y Gronfa yn cael ei gaffael ar ôl cymeradwyo'r OBC. [PARHAUS] - Bid SPF wedi'i wneud am gyllid i ddarparu cefnogaeth parodrwydd buddsoddwyr. [YN MYND RHAGDDO]
Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu yn lleol (swyddi lleol, cyfleoedd cadwyn gyflenwi lleol,	<ul style="list-style-type: none"> - Bydd y prosiect yn ymgysylltu â'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a darparwyr Addysg y Cynllun Twf er mwyn adnabod y math o sgiliau sydd eu hangen a'r amserlenni ar gyfer swyddi newydd posib, fel bod modd rhoi cynlluniau ac adnoddau perthnasol yn eu lle i gynnig cyfleoedd lleol. [PARHAUS]

<p>buddsoddiad lleol), yna mae risg nad yw'r prosiect yn cyfrannu at amcanion y Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru.</p>	<p>- Bydd y prosiect yn ymgysylltu â chynrychiolwyr y gadwyn gyflenwi a nodwyd yn y cynllun ymgysylltu â rhan-ddeiliaid er mwyn eu hysbysu o gyfleoedd. [PARHAUS]</p> <p>- Bydd y prosiect yn datblygu cynllun gwireddu buddion i reoli, tracio a gwireddu'r buddion fel sydd wedi'u nodi yn yr achos busnes. [PARHAUS]</p> <p>- Bydd y prosiect yn datblygu cynllun caffael sy'n cynnwys strategaeth gwerth cymdeithasol gyda arbenigwr caffael y PMO. [PARHAUS]</p>
<p>Os bydd ymyrraeth fwriadedig cronfa yn dyblygu, neu'n gorgyffwrdd â ffynonellau cyllid eraill sydd ar gael i rann-ddeiliaid, mae risg y bydd cyllid y Cynllun Twf yn disodli cyfleoedd i ddod â buddsoddiad pellach i'r rhanbarth.</p>	<p>- <i>Strwythur y gronfa (cronfa ymbarél) wedi'i dylunio i fod yn hyblyg ac addasadwy [WEDI CAU]</i></p> <p>- Mapio cynlluniau cefnogi a ffynonellau cyllido presennol i'w ystyried yn ystod y broses o ddatblygu achos busnes. [PARHAUS]</p> <p>- Ymgysylltu â phrif gyflawnwyr y cronfeydd presennol i sicrhau bod gan y prosiect syniad o'r cronfeydd mewn datblygiadau sy'n debygol o ddod yn weithredol yn y byrdymor a'u hystyried yn ystod y broses o ddatblygu'r achos busnes. [PARHAUS]</p>
<p>Os na fydd y cyllid refeniw sydd ei angen i ymdrin â'r costau rhedeg cychwynnol yn cael ei adnabod a'i sicrhau, mae risg na fydd modd i'r gronfa lansio a pharhau i weithredu am oes y gronfa a chyflawni yn erbyn yr amcanion gwario.</p>	<p>- <i>Bydd y prosiect yn defnyddio incwm refeniw o fenthyciadau i ariannu costau gweithredol a bydd yn ymdrin ag unrhyw gronfeydd wrth gefn neu fenthyciadau a ddefnyddiwyd i ymdrin â'r bwlch yn ystod y flwyddyn neu ddwy gyntaf o weithredu. Mae'r cyllid ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu, cyn i ddychweliadau refeniw gael eu creu, wedi'u nodi. [WEDI CAU]</i></p> <p>- <i>Refeniw yn cael ei adnabod o gronfeydd wrth gefn prosiectau'r PMO i ymdrin â'r bwlch cyllido ar gyfer y flwyddyn gyntaf o weithredu. [WEDI CAU]</i></p> <p>- <i>Mae'r derbyniad cyllid a ragwelir ar gyfer blwyddyn 1 wedi'i leihau yn y modelu ariannol er mwyn adlewyrchu derbyniad graddol o gyllid ym mlwyddyn 1. [WEDI CAU]</i></p> <p>- Os oes angen am gyllid refeniw y tu hwnt i'r flwyddyn gyntaf, bydd yr opsiynau a ganlyn yn cael eu hystyried:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defnyddio cyllid cyfalaf y prosiect • Defnyddio cyllideb datblygu prosiect ANW • Defnyddio cronfeydd wrth gefn Uchelgais Gogledd Cymru • Defnyddio grant y Cynllun Twf 1.5% PMO top slice • Cyllid gan bartneriaid Uchelgais Gogledd Cymru • Cyllid gan Lywodraeth Cymru / Llywodraeth y DU <p>neu gyfuniad o'r uchod [PARHAUS]</p>

8. AMSERLEN Y PROSIECT A'R CAMAU NESAF

Gweithgaredd	Dyddiadau Targed
Penderfyniad cymeradwyo OBC y Bwrdd Uchelgais Economaidd	24 Mawrth 2023
Profi'r Farchnad yn Anffurfiol gydag ymgynghorwyr y gronfa	Maw - Ebr 2023
Caffael Ymgynghorydd Cronfa ac Ymgynghorydd/Ymgynghorwyr FBC	Mai - Awst 2023
Cyflwyno FBC Drafft	Hyd / Tach 2023
Adolygiad Porth 3 (i'w gadarnhau)	Tach / Rhag 2023
Adolygiad y PMO, y Bwrdd Prosiect a'r Bwrdd Rhaglen o'r FBC	Tach / Rhag 2023
Bwrdd Portffolio yn ystyried y FBC	Rhag 2023 / Ion 2024
Y Bwrdd Uchelgais yn ystyried y FBC (penderfyniad ariannu)	Rhag 2023 / Ion 2024
Lansio'r gronfa	Ion/Chwe 2024
Cau'r gronfa	Diwedd 2028/29
Gwerthusiad terfynol	Diwedd 2033

9. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 9.1. Mae'r prosiect Ynni Lleol Blaengar yn un o'r prosiectau sydd wedi'u cynnwys o fewn Achos Busnes y Portffolio gyda £25m o gyllid cyfalaf wedi'i glustnodi dros dro i gefnogi'r prosiect, yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth derfynol yr achos busnes llawn.
- 9.2. Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol o gymeradwyo'r OBC, fodd bynnag, mae hyn yn cynrychioli carreg filltir arwyddocaol ar gyfer y prosiect a phe byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r achos busnes, bydd angen gwaith pellach i ddiweddarau'r achos busnes ar ôl derbyn y caniatâd i ddarparu eglurder ar y costau, y risgiau a'r buddion sydd ynghlwm â'r prosiect cyn i'w Bwrdd wneud penderfyniad buddsoddi terfynol.
- 9.3. Bydd y costau refeniw sy'n gysylltiedig ag ymgymryd â'r broses gaffael a datblygu'r FBC yn cael eu talu allan o gyllideb gytunedig y Swyddfa Rheoli Portffolio.
- 9.4. Cynigir bod yr incwm refeniw sy'n cael ei greu gan y Gronfa drwy ffioedd llog yn ymdrin â'r holl gostau mewnol am adnoddau a chostau mewnol ar gyfer rheoli ynghyd ag unrhyw ffioedd a thaliadau trafodion sydd ddim yn cael eu codi ar ymgeiswyr. Fodd bynnag, mae gofyn am arian refeniw cychwynnol o c£150,000 i gwrdd â'r costau gweithredol yn ystod y cyfnod lansio a blwyddyn weithredu lawn gyntaf y Gronfa fydd yn cael eu cwrdd o gronfeydd wrth gefn prosiect y Swyddfa Rheoli Portffolio. Bydd unrhyw refeniw dros ben sy'n cael ei gynhyrchu gan y prosiect drwy ffioedd llog yn cael eu cadw gan y Swyddfa Rheoli Portffolio mewn blynyddoedd i ddod.

10. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 10.1. Mae'r gwaith o ddatblygu'r achos busnes a'r prosesau sicrwydd wedi'i wneud yn unol â gofynion cytundeb terfynol y Cynllun Twf.
- 10.2. Mae cais wedi'i wneud am gyngor cyfreithiol allanol ar y prosiect i gadarnhau gallu'r Bwrdd i fuddsoddi yn y prosiect mewn modd sy'n cydymffurfio â rheoli cymhorthdal (cymorth gwladwriaethol). Mae'r cyngor cychwynnol yn cael ei adolygu a bydd yn llywio'r gwaith sy'n arwain at gyflwyno'r FBC. Efallai y bydd angen comisiynu cyngor cyfreithiol pellach ar ôl derbyn yr FBC cyn i'r Bwrdd wneud penderfyniad buddsoddi terfynol.
- 10.3. Pe byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r achos busnes amlinellol, caiff y dogfennau perthnasol eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymeradwyo'r broses sicrwydd cyn y gall y prosiect frw ymlaen i'r cam nesaf.

11. ASESIAU EFFAITH

- 11.1. Mae asesiad effaith integredig (Atodiad B) wedi'i wneud i asesu effaith y prosiect ar yr iaith Gymraeg, cydraddoldeb ac yn erbyn Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Ni chafodd unrhyw effeithiau negyddol eu hadnabod drwy'r asesiad.



ATODIADAU:

Atodiad A	Achos Busnes Amlinellol - 'Smart Local Energy OBC V1.1'
Atodiad B	Asesiad Effaith Integredig

DOGFENNAU CEFNDIROL (mae rhai dogfennau yn cynnwys gwybodaeth eithriedig):

- Atodiadau o'r Achos Busnes Amlinellol - 'Smart Local Energy OBC V1.1'
 - Traciwr Adolygu OBC - 'SLE_OBC_PMO Review Tracker rev1'
 - Adroddiad Adolygiad Porth 2 - 'NWGD Gate 2 Review AH 22 128 Version 7.0 to SRO'
-

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:**i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya:**

"Mae cyflwyno CBA i'w ystyried gan y Bwrdd yn gam allweddol er gweithredu y Gytundeb Twf. Cam interim yw hon tuag at baratoi Cynllun Busnes Terfynol a chadarnhau'r ariannu. Tanlinelli'r y risgiau â'r elfennau fydd angen eu cadarnhau cyn cyflwyno Achos Busnes Terfynol mewn modd priodol yn yr adroddiad. Bydd cadarnhau y sefyllfa gyfreithiol derfynol ynglŷn a rheolaeth cymorth dal yn rhan o'r gwaith yma. Fel rhan o'r gwaith bydd angen paratoi cytundeb ariannu sydd yn ddogfen gyfreithiol allweddol I ddiffinio a sicrhau disgwyliadau y Bwrdd o ran cyflawni a'r dull o gyflawni'r prosiect."

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya):

"Gwelir o'r dogfennau sydd wedi eu cyflwyno fod gwaith manwl iawn wedi cael ei gyflawni wrth ddarparu'r Cynllun Busnes Amlinellol hwn. Credaf fod y risgiau ariannol ac anariannol perthnasol wedi cael sylw dilys, ac mae trefniadau lliniaru priodol yn eu lle, neu wedi cael eu hamlinellu.

Rwyf yn fodlon â chywirdeb ariannol yr wybodaeth sydd wedi ei gyflwyno, yn enwedig Rhan 4 o'r Cynllun Busnes Amlinellol, sef yr Achos Ariannol. Bydd gwaith yn parhau ar yr holl agweddau hyn yn ystod datblygu'r Cynllun Busnes Terfynol. Gallaf gadarnhau mai arian cyfalaf yn unig yw pecyn ariannu y Cynllun Twf.

Felly, ar sail y dystiolaeth rwyf wedi ei weld nid oes gennyf wrthwynebiad i'r penderfyniadau a geisir."
